



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางอรุณรัศมี นะพราณบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑.โครงการตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๒๒	โครงการ

๒.โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๓๒	โครงการ

๓.โครงการกักเงินปี ๒๕๖๓

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑๘	โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๓ โครงการ รวมเงินงบประมาณ ๑๗,๔๖๐,๑๐๐.- บาท ดังนี้

๑.) เปิดตัดปี๒๕๖๓ ไว้ จำนวน ๑๔ โครงการ (ซึ่งนำมาจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) วงเงินงบประมาณ ๓,๔๕๓,๙๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๒๑๔,๒๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๗ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

๒.) จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๖ โครงการ (โครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ โครงการ ตั้งไว้ ๗,๙๐๐,๔๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๗,๗๖๑,๘๐๐ บาท และจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ โครงการ ตั้งไว้ ๕,๒๖๕,๓๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๕,๑๖๘,๖๐๐ บาท) รวมวงเงินงบประมาณ ๑๓,๑๖๕,๗๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒,๙๓๐,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๑ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

๓.) เปิดตัดปี๒๕๖๔ ไว้ จำนวน ๓ โครงการ (โครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ตั้งไว้ ๗๘๓,๒๐๐ บาท และจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ตั้งไว้ ๑๐๖,๘๐๐ บาท) รวมวงเงินงบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๙ โครงการ รวมเงินงบประมาณ ๑๑,๖๖๑,๒๐๐ บาท

ดังนี้

๑.) จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ (โครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ตั้งไว้ ๓,๐๙๐,๗๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๐๘๔,๐๐๐ บาท และจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ ตั้งไว้ ๕,๒๗๓,๗๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๕,๒๖๐,๐๐๐ บาท) รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๘,๓๔๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๘ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด


๒.) เปิดตัดปี๒๕๖๔ ไว้ จำนวน ๒ โครงการ (จ่ายจากเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) วงเงินงบประมาณ ๓,๒๙๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๑ โครงการ รวมเงิน

งบประมาณ ๔,๔๑๐,๖๐๐ บาท ดังนี้

๑.) จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ (จ่ายจากเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) วงเงินงบประมาณ ๔,๔๑๐,๖๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๒๓๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๘ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

๒.) เปิดตัดปี๒๕๖๓ ไว้ จำนวน ๔ โครงการ (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓) วงเงินงบประมาณ ๓,๒๐๙,๑๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๘ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

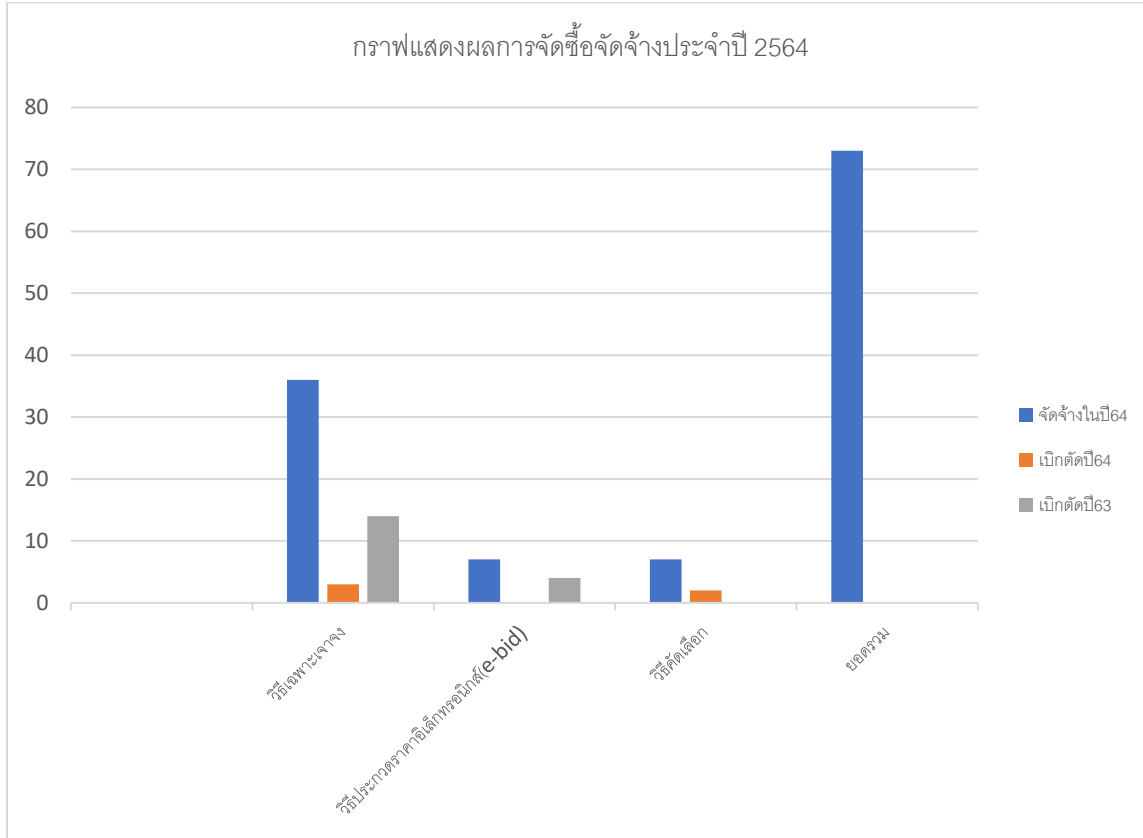

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

-เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ไม่มีหน่วยงานออกแบบและไม่มีเจ้าหน้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงต้องดำเนินการขอความร่วมมือกับส่วนงานราชการอื่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นสาเหตุทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างตาม ผด.2 เป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

-เนื่องจากเกิดปัญหาของโรคระบาด(โควิด-19) จึงทำให้ สภาพเศรษฐกิจในส่วนของการจัดเก็บรายได้ลดลง เกิดภาวะเลิกการจ้างงาน โรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ ปิดกิจการลงทำให้รายได้ลดลง จึงต้องกันเงินรายได้ไว้ในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาจทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพทางการเงินการคลังได้ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ

-คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการโอน(ย้าย) หน่วยงานทำให้ การประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเริ่มดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดังกล่าวฯ ต้องใช้เวลามากขึ้น

แนวทางแก้ไข

- ดำเนินการประสานหน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
 - ดำเนินการประสานงาน จัดทำคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน (บาท)	ส่วนต่าง จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
๑	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย ป้ายละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ทำการ อบต.หนองระเวียง	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๗๑		/	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบบทางรถไฟจาก หนองหัวถึงโรงเรียนของแยะ หมู่ที่ ๑ บ้านของแยะ	๓๔๐,๘๐๐.๐๐	๓๓๘,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๙		/	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่นายเป็ม จากถนน คสล.ไปบ้านหนองระเวียงถึง หนองหัวถึง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไทร	๔๑๘,๘๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๑๙		/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเฉลียวถึงบ้านหนองพาน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองม่วง	๒๓๕,๓๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๑๓		/	
๖	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากทางหมู่บ้านหนองขามถึงศาลตาปู่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขาม	๕๙๐,๗๐๐.๐๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐			/	
๗	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำหมู่บ้าน ๔๐ บาท หมู่ที่ ๖ บ้านทับช้าง	๓๑๙,๑๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๐.๓๔		/	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน (บาท)	ส่วนต่าง จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประชล ถึงบ้านนางคำ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบมะค่า	๒๑๙,๗๐๐.๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๙		/	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางน้อยถึงทางเชื่อมถนนหินคลุก ไปบ้านทับช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบมะค่า	๓๓๙,๗๐๐.๐๐	๓๓๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๙		/	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกชะอม หมู่ที่ ๘ บ้านชะอม	๑๔๕,๙๐๐.๐๐	๑๔๕,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๐.๒๗		/	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนาย ย่อนถึงนายทน หมู่ที่ ๙ บ้านชะอม	๓๒๑,๔๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๐.๔๔		/	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายฮั่วถึงลาดยางไปหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโตนด	๔๔๓,๕๐๐.๐๐	๔๔๓,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๗		/	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินรอบบึงโตนดจาก กำแพงวัดถึงประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านโตนด	๒๘๕,๓๐๐.๐๐	๒๘๓,๘๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๕๓		/	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังบ้านหมวดฟุ้งถึงบ้านนายธีระพล หมู่ที่ ๑๑ บ้านโตนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑.๒๐		/	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลตาปู่ถึงบ้านนายชัยรัตน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองระเวียง	๓๘๑,๗๐๐.๐๐	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐.๑๘		/	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน (บาท)	ส่วนต่าง จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสมใจถึงกำแพงวัด หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองระเวียง	๓๐๙,๒๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๖		/	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเจ้าเตียงถึงที่นางเย็น หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสมอ	๔๖๔,๕๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๑		/	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.หลังหอนายมานพถึงที่นางไย หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสมอ	๑๖๑,๘๐๐.๐๐	๑๖๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๑๙		/	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่นายคงถึง ไร่ นางยังเชื่อมถนนวงแหวน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองพะลาน	๔๕๔,๔๐๐.๐๐	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๐.๓๑		/	
๒๐	โครงการปรับปรุงห้องทำงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองระเวียง บริเวณห้องกองช่าง อบต.หนองระเวียง	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๖๑		/	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	๘๗,๘๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๓๔		/	
๒๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๒๔	/		
	รวม	๘,๙๑๓,๖๐๐.๐๐	๘,๘๓๖,๗๐๐.๐๐	๗๖,๙๐๐.๐๐	๐.๘๖			
